

INFORME MENSUAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Septiembre 2023

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
1. OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL	3
1.1. CAPACIDAD INSTALADA DEL SEN	3
1.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3
1.3. VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5
1.4. COSTOS MARGINALES REALES	5
1.5. PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA	5
2. INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	6
2.1. PROGRAMA DE OPERACIÓN PARA LOS SIGUIENTES 12 MESES	6
2.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA ESPERADA	6
2.3. STOCK DE COMBUSTIBLES DISPONIBLE PARA GENERACIÓN	6
2.4. INDISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES	6
2.5. TRAMOS DE COSTO DE FALLA	6
2.6. MODELOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	6
3. CAMBIOS EN EL ESTADO DE INSTALACIONES	7
3.1. INSTALACIONES DE GENERACIÓN	7
3.2. INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN	9

INTRODUCCIÓN

El Coordinador Eléctrico Nacional es un organismo técnico e independiente, encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que operen interconectadas entre sí, cuya cobertura geográfica comprende desde las regiones de Arica y Parinacota, por el Norte, hasta la Isla Grande de Chiloé, por el Sur, con una longitud cercana a los 3.100 km.

Según lo señala el artículo 60 del Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico, y con el fin de proveer información de calidad, oportuna y transparente, el Coordinador pone a disposición la siguiente información de interés para estudios y análisis del mercado eléctrico chileno:

- a) Programa de operación para los siguientes 12 meses, incluyendo niveles de operación de los embalses, disponibilidad de combustible para generación y la generación esperada de cada central;
- b) Indisponibilidad y programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones;
- c) Disponibilidad de combustibles para generación eléctrica;
- d) Proyectos que se encuentren en período de puesta en servicio indicando la fecha de inicio y las principales características del proyecto;
- e) Proyectos que hayan entrado en operación indicando la respectiva fecha y las principales características del proyecto;
- f) Tramos de costo de falla;
- g) Modelación del sistema de transmisión; y
- h) Programas de mantenimiento, solicitudes de trabajo y de desconexión de instalaciones.

En cumplimiento con lo señalado, se presenta el Informe Mensual del Coordinador Eléctrico Nacional, con información al cierre de agosto de 2023, el cual está estructurado en tres capítulos, cuyo contenido se resumen a continuación:

- i. Operación del Sistema Eléctrico Nacional: corresponde a información estadística de la operación real del SEN, respecto de la capacidad instalada del SEN, generación de energía eléctrica, ventas de energía eléctrica, costos marginales de energía y el año hidrológico.
- ii. Información para la Planificación de la Operación: corresponde a información necesaria para realizar la planificación de la operación del SEN.
- iii. Cambios en el Estado de Instalaciones: se presentan los proyectos que se encuentran en período de puesta en servicio y aquellos que han entrado en operación.

1. OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

En este capítulo, se presenta un panorama general de la operación real del SEN ocurrida durante el mes de agosto de 2023.

1.1. CAPACIDAD INSTALADA DEL SEN

La capacidad instalada (potencia máxima bruta) del SEN al cierre de agosto de 2023 alcanzó los 34.113,9 MW (considerando 889,6 MW en proyectos con periodo de puesta en servicio), de los cuales el 39,0% es provisto por centrales termoeléctricas y el 22,0% por centrales hidroeléctricas, como se muestra en la tabla.

Tipo de Tecnología	MW	[%]
Hídrica	7.518,2	22,0%
Embalse	3.483,8	10,2%
Pasada	4.034,4	11,8%
Térmica	13.318,0	39,0%
Gas Natural	4.507,5	13,2%
Carbón	3.994,5	11,7%
Diésel	2.908,2	8,5%
Termosolar	114,4	0,3%
Otros Térmicos*	1.793,4	5,3%
Eólica	4.726,5	13,9%
Solar	8.456,4	24,8%
Geotérmica	94,8	0,3%

* Otros térmicos: Biogás, Biomasa, Fuel Oil, Petcoke y Cogeneración.

1.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La participación en la generación de energía mensual según tipo de tecnología durante el mes, y su comparación con igual periodo del año anterior, se resume en el siguiente cuadro:

SEN	ago-22 [GWh]	ago-22 [%]	ago-23 [GWh]	ago-23 [%]
Hídrica	2.046,1	29,1%	2.662,0	37,4%
Térmica	3.126,6	44,4%	2.517,8	35,4%
Eólica	779,2	11,1%	780,1	11,0%
Solar	1.047,3	14,9%	1.120,9	15,8%
Geotérmica	44,1	0,6%	33,5	0,5%

A su vez, la generación de energía en el SEN presentó los siguientes indicadores, en cuanto a generación máxima y mínima horaria, máxima diaria y mensual:

Generación	ago-22	ago-23	Δ% 2023 vs 2022
Máx. horaria [MWh/h]	11.249,3	10.871,5	-3,4%
	Día 16, hora 13	Día 7, hora 20	
Mín. horaria [MWh/h]	7.323,4	7.670,6	+4,7%
	Día 28, hora 8	Día 27, hora 8	
Máx. diaria [GWh/día]	242,7	239,9	-1,2%
	mar 16/ago22	lun 07/ago23	
Mensual [GWh/mes]	7.043,4	7.114,2	+1,0%

La generación por tipo de combustible se presenta en el siguiente cuadro:

Tipo de combustible	Energía [GWh]	% Participación
Solar	1.120,9	15,8%
Eólica	780,1	11,0%
Geotérmica	33,5	0,5%
Termosolar	62,1	0,9%
Biogás	14,3	0,2%
Biomasa	158,0	2,2%
Carbón	1.187,2	16,7%
Cogeneración	31,2	0,4%
Gas Natural	1.016,7	14,3%
Hidráulica Pasada	1.075,4	15,1%
Hidráulica Embalse	1.586,6	22,3%
Diésel	12,8	0,2%
Fuel Oil	0,1	0,0%
Petcoke	35,3	0,5%
Total	7.114,2	100%

En la Figura 1 se presenta la participación de cada región en la generación de energía eléctrica, separado por tipo de tecnología.

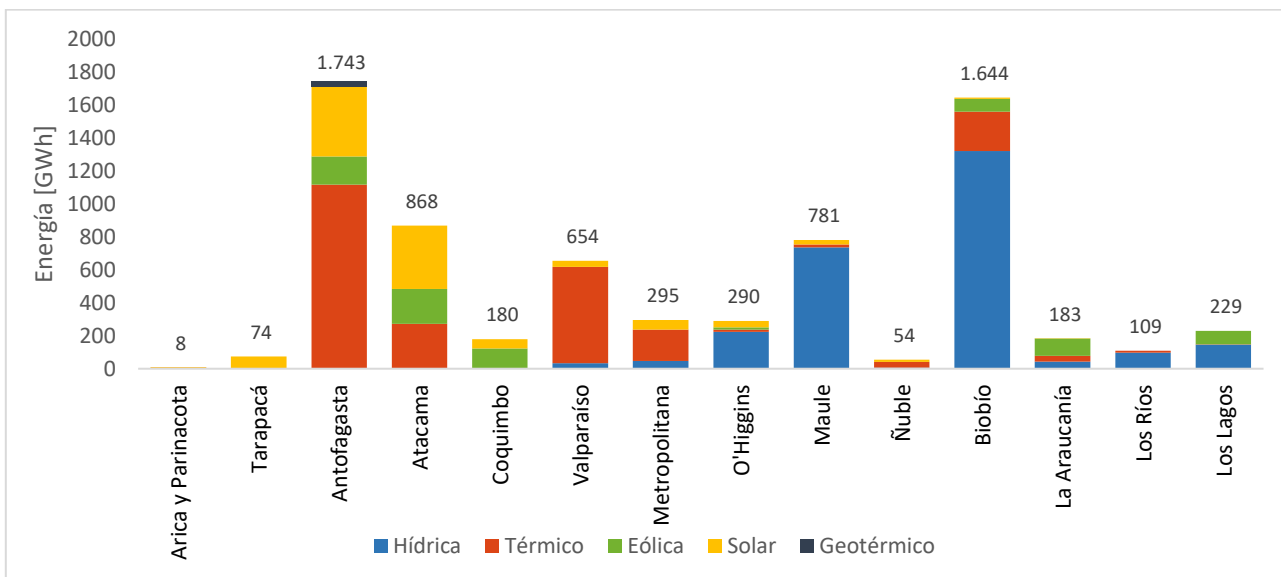


Figura 1: Generación de energía eléctrica por región y tecnología.

Adicionalmente, el detalle de la generación de energía renovable no convencional (ERNC), según lo establecido en la Ley 20.257, se detalla en el siguiente cuadro:

Calificación	Tipo	SEN [GWh]
Convencional	Hidráulica Embalse	1.586,6
	Hidráulica Pasada	851,8
	Termoeléctrica	2.305,8
	Total Convencional	4.744,2
ERNC (Ley 20.257)	Hidráulica Pasada	223,6
	Biocombustibles	149,9
	Eólica	780,1
	Solar	1.120,9
	Termosolar	62,1
	Geotérmica	33,5
	Total ERNC	2.370,0

* Carbón, Diésel, Gas Natural, Petcoke, Fuel Oil, Biocombustibles (biogás, biomasa) y cogeneración.

1.3. VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El detalle de las ventas de energía para el mes de agosto, por tipo de cliente, es el siguiente:

Ventas (GWh)	ago-22 [GWh]	ago-23 [GWh]	Δ% 2023 vs 2022
Regulados	2.763,7	2.583,6	-6,5%
Libres	3.804,5	4.059,6	+6,7%
Total	6.568,2	6.643,2	1,1%

1.4. COSTOS MARGINALES REALES

Durante agosto, el Costo Marginal Real de energía (US\$/MWh), en barras representativas del SEN, presentó las siguientes variaciones respecto del mismo mes de 2022:

Año	Crucero 220 kV	P. de Azúcar 220 kV	Quillota 220 kV	Alto Jahuel 220 kV	Charrúa 220 kV	Pto. Montt 220 kV
2022	101,2	108,8	110,8	111,4	100,3	198,9
2023	53,7	52,0	51,7	51,6	48,5	36,3
Δ%	-46,9%	-52,3%	-53,3%	-53,6%	-51,6%	-81,8%

1.5. PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA

Finalmente, cabe destacar que, para el SEN, las características del año hidrológico abr23 – mar24, al cierre de agosto, muestran que la probabilidad de excedencia alcanzó el 90% (año del tipo seco).

2. INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

En este capítulo se presenta información relativa a la planificación de la operación segura y económica del SEN.

2.1. PROGRAMA DE OPERACIÓN PARA LOS SIGUIENTES 12 MESES

Este programa mensual de generación tiene por objetivo estudiar la situación de abastecimiento del SEN durante 12 meses, bajo diferentes condiciones hidrológicas. En particular se presentan los resultados de energía generada por tipo de aporte, las trayectorias de cotas de los embalses, la energía embalsada y los costos marginales. Este programa se encuentra publicado en el sitio web del Coordinador ¹.

2.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA ESPERADA

La generación detallada por central y por tipo de tecnología se encuentra en el programa mensual de generación de 12 meses, publicado en el sitio web del Coordinador ¹.

2.3. STOCK DE COMBUSTIBLES DISPONIBLE PARA GENERACIÓN

El stock de combustibles disponibles para la generación de las centrales del SEN se encuentra en la plataforma Sistema de Costos Variables e Información de Combustibles ².

2.4. INDISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES

2.4.1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El programa de mantenimiento preventivo utilizado en la planificación de la operación se encuentra en el programa mensual de generación de 12 meses publicado en el sitio web del Coordinador ³.

2.4.2. EVENTOS NO PROGRAMADOS

Los eventos no programados ocurridos en la operación del mes, que han tenido como resultado la elaboración de un Estudio de Análisis de Falla (EAF) de acuerdo con la Normativa vigente, se encuentran publicados en el sitio web del Coordinador ⁴.

2.5. TRAMOS DE COSTO DE FALLA

Los Costos de Racionamiento utilizados corresponden a aquellos publicados por la Comisión Nacional de Energía en su Informe de Fijación de Precios de Nudo, estos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Costo racionamiento SEN agosto 2023

Profundidad de Falla [%]	Costo de Racionamiento [USD/MWh]
0-5%	435,1
5-10%	464,0
10-20%	533,2
Sobre 20%	585,3

2.6. MODELOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

La modelación del Sistema de Transmisión del SEN se encuentra publicado en el sitio web del Coordinador ⁵.

¹ <https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-de-la-programacion-de-la-operacion/programacion-mensual/>

² <http://costosvariables.coordinador.cl/>

³ <https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/programa-mantenimiento-preventivo-mayor-2/>

⁴ <https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-operacionales/estudios-de-analisis-de-falla/>

⁵ <https://www.coordinador.cl/modelacion-sen/>

3. CAMBIOS EN EL ESTADO DE INSTALACIONES

A continuación, en este capítulo se presentan los proyectos que se encuentran en período de puesta en servicio y aquellos que han entrado en operación.⁶

3.1. INSTALACIONES DE GENERACIÓN

Tabla 2: Centrales en etapa PES al mes de agosto.

CENTRAL	PROPIETARIO	ESTADO	TECNOLOGÍA	TIPO	FECHA PES	POTENCIA [MW]
Panguipulli	Latinoamericana S.A.	En Pruebas	Hídrico	PMGD Hídrico	03-12-2015	0,35
Chanleufu II	Transoceánica S.A.	En Pruebas	Hídrico	PMGD Hídrico	19-05-2016	8,4
PMGD Viña Tarapacá	Andes Energy & Capital S.A.	En Pruebas	Hídrico	PMGD Hídrico	02-08-2016	0,25
Parque La Travesía	Parque Solar Tabolango SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	31-03-2022	9
Parque Solar Fulgor	Parque Fulgor Spa	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	29-04-2022	2,6
FV Recoleta	Diego de Almagro Solar 3 S.A.	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	29-06-2022	9
Parque Solar Cantillana	Parque Solar Cantillana SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	30-06-2022	9
PFV Coinco	Energía Renovable Ebano SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	23-08-2022	2,8
Cóndor Chépica	Parque Fotovoltaico Chépica SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	22-09-2022	3
PFV Lima	Parque Fotovoltaico Chépica SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	22-09-2022	3
Hidroeléctrica Piedras Negras	Hidroeléctrica Piedras Negras SpA	En Pruebas	Hídrico	Hidro Pasada	24-10-2022	3
Mapa (Etapa 2)	Celulosa Arauco y Constitución S.A.	En Pruebas	Térmico	Biomasa	23-11-2022	166
Los Lirios	Planta Solar Los Lirios II SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	28-11-2022	9
Parque Jotabeche	Parque Solar Jotabeche SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	13-12-2022	9
Cóndor Petorca	Parque Fotovoltaico Peñaflor SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	21-12-2022	3
Parque Eólico Atacama	Parque Eólico Atacama SpA	En Pruebas	Eólico	Eólico	11-01-2023	163,5
PFV Las Golondrinas	PFV Las Golondrinas SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	20-01-2023	9

⁶ Más información en el siguiente enlace <https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/reporte-de-proyecto-nuevas-instalaciones-y-modificaciones-relevantes/>

CENTRAL	PROPIETARIO	ESTADO	TECNOLOGÍA	TIPO	FECHA PES	POTENCIA [MW]
Meseta de Los Andes	Tercera Región Solar SpA	En Pruebas	Solar	NI	16-02-2023	160
BESS Diego de Almagro Sur	Colbun S.A.	En Pruebas	BESS	MR	20-02-2023	8
FV Huaquellón	Nueva Gales SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	16-12-2022	9
PFV El Pichón	PFV El Pichón SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	10-02-2023	3
PFV Ayla Solar	PFV Ayla Solar SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	17-02-2023	9
Parque El Trigal	Parque Solar El Trigal SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	15-03-2023	9
Parque Pueblo Seco	Parque Solar Pueblo Seco SpA	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	15-03-2023	9
Proyecto Solar Fotovoltaico Elena - Primera Etapa	Solar Elena SpA	En Pruebas	Solar	NI	17-04-2023	270,0
La Gloria-21	La Gloria S.A.	En Pruebas	Biomasa	PMGD Biomasa	17-05-2023	3,1
PSF Coyunche	Per Parinacota	En Pruebas	Solar	PMGD Solar	18-05-2023	2,7

A continuación, se presenta el estado de las instalaciones de generación que se encuentran en período de puesta en servicio (PES), así como aquellas que han recibido en agosto la calificación de Entregadas a la Operación (EO).

3.1.1. CENTRALES EN ETAPA DE PUESTA EN SERVICIO

La Figura 2 muestra la participación de los diferentes tipos de tecnología actualmente en pruebas (etapa PES). Asimismo, se muestra la cantidad de proyectos en ese estado [*].

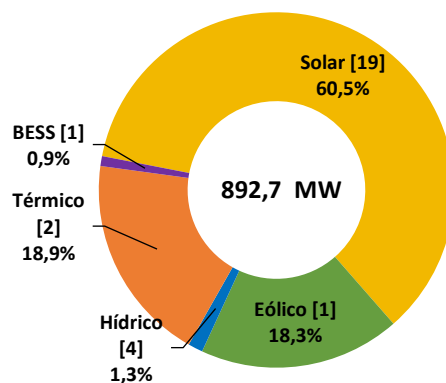


Figura 2: Centrales SEN en pruebas según tecnología.

Nota: Los proyectos BESS no suman a la capacidad instalada

3.1.2. CENTRALES ENTREGADAS A LA OPERACIÓN

En la Tabla 3 se muestran las instalaciones de generación entregadas a la operación (EO) en agosto.

Tabla 3: Centrales SEN entregadas a la operación.

CENTRAL	PROPIETARIO	ESTADO	TECNOLOGÍA	TIPO	POTENCIA [MW]	EO
PE Renaico 2	Enel Green Power del Sur SpA	Entregada	Eólico	Eólica	144	04-08-2023
Planta Fotovoltaica Caracas II	Generadora SolSoliv SpA	Entregada	Solar	Solar	9	09-08-2023
PMGD Parque Fotovoltaico Doña Igna	Parque Fotovoltaico Doña Igna SpA	Entregada	Solar	PMGD Solar	2,2	04-08-2023

3.2. INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN

En la Tabla 4 se presentan las instalaciones de transmisión que se interconectaron durante el mes de agosto.

Tabla 4: Instalaciones de transmisión energizadas.

PROPIETARIO	FECHA	INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN
Transelec	05-08-2023	S/E Rahue primera energización extensión de barra de 220 kV sección 2. (Proyectos futuros)
